

Conexão das Escolas

Atualização: 20/06/2026

Sobre

O projeto Piloto Conexão das Escolas busca viabilizar, em âmbito nacional, a conectividade de escolas públicas que não possuem acesso adequado para o exercício de atividades educacionais dos estudantes.

A definição das escolas contempladas considerou os dados levantados no Censo Escolar 2021 que traz um mapeamento das escolas mais necessidades localizadas em áreas rurais e urbanas.


O projeto é um piloto para conexões terrestres dentro da iniciativa de governo Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações (MCom), que prioriza a busca pela melhor tecnologia disponível para conexão à internet na região, ao menor custo.

A RNP formalizou a parceria com o MCom para esta ação em 2022 iniciando neste mesmo ano as ações do projeto.

Macro cronograma (Exercício 2022 à 2026) - Em Execução


Metas	Início	Término	% de Execução
Acompanhamento técnico das conexões junto às prestadoras de se...	1/24/2022	7/31/2026	95%
Construção e manutenção de uma plataforma para gestão das cont...	1/24/2022	7/31/2026	95%
Efetivação das conexões às escolas	1/24/2022	7/31/2026	95%

Principais resultados alcançados até o momento

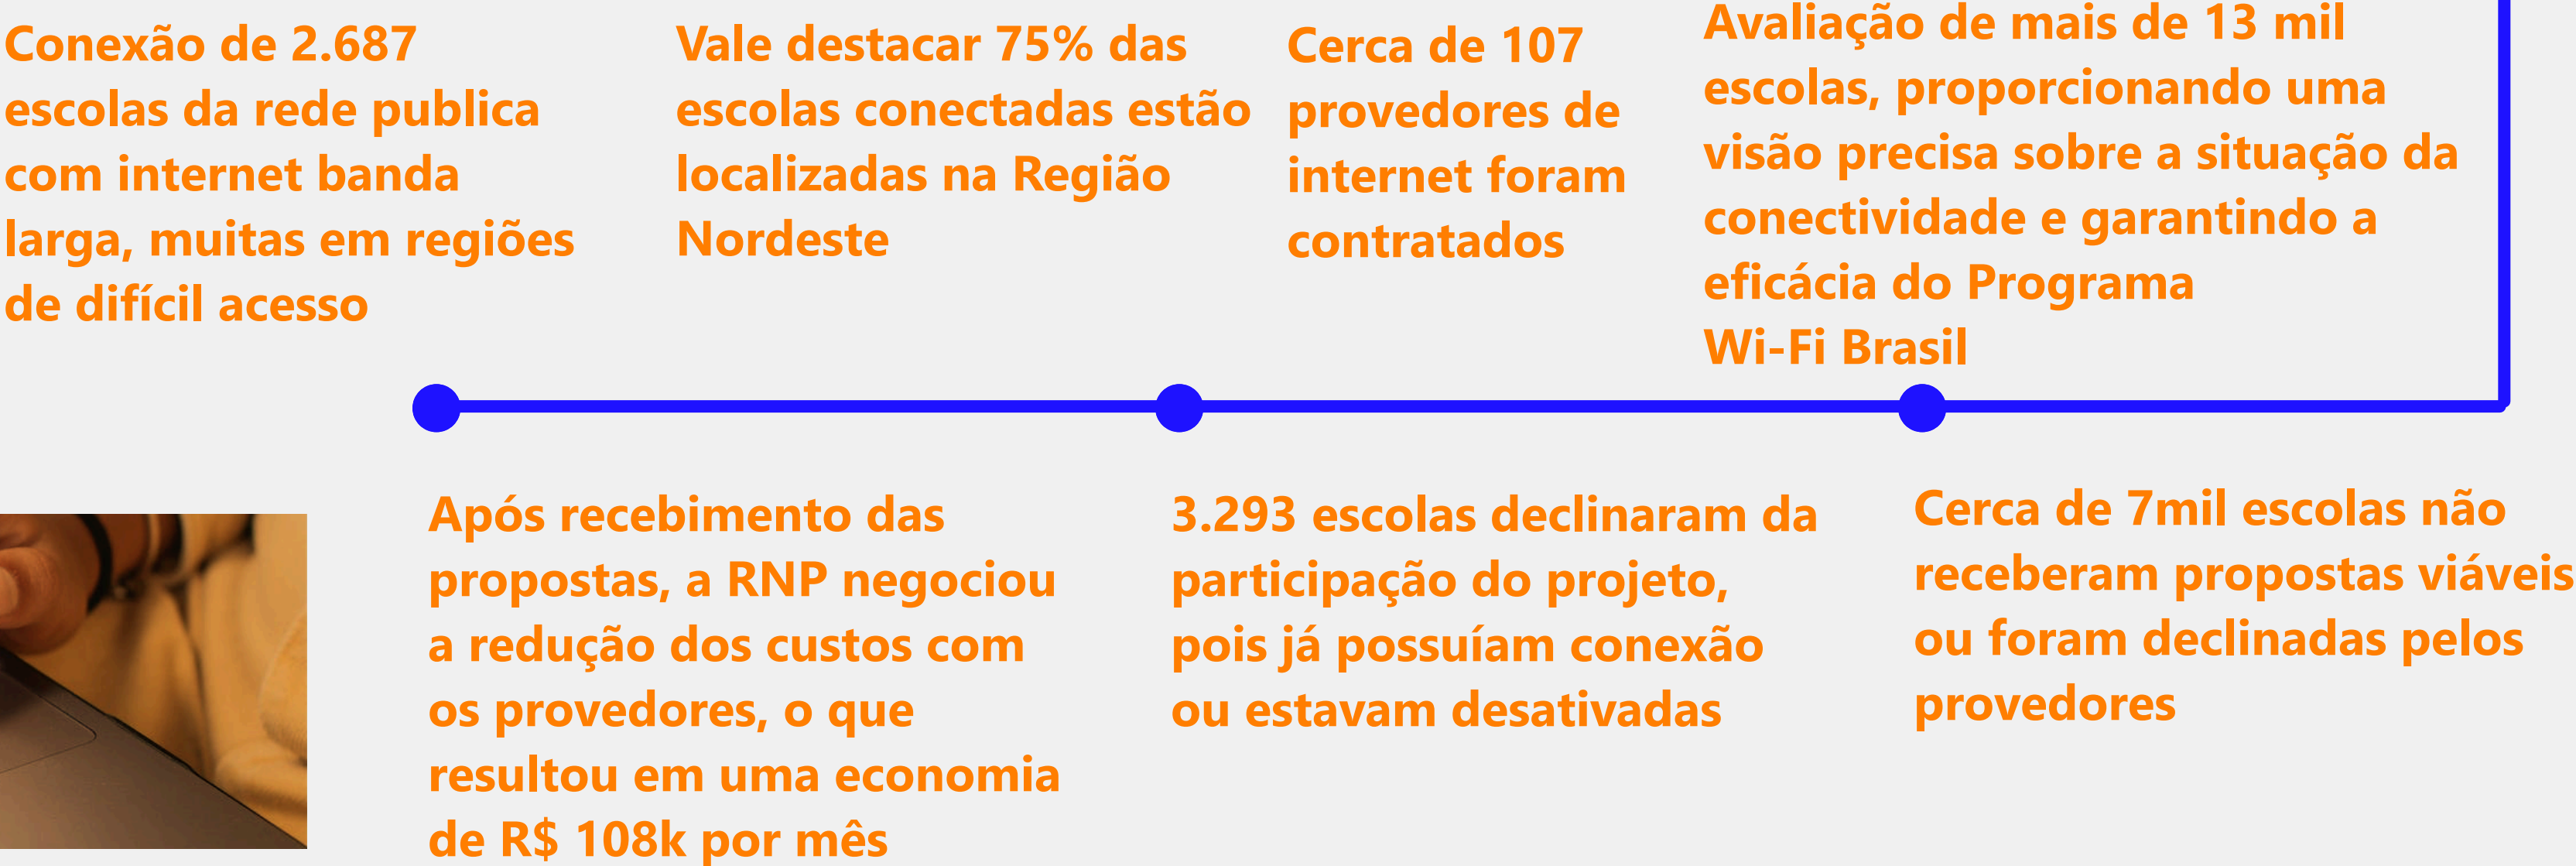


Status das ativações

Tecnologia ● Fibra ● Satélite ● Rádio ● Cabo

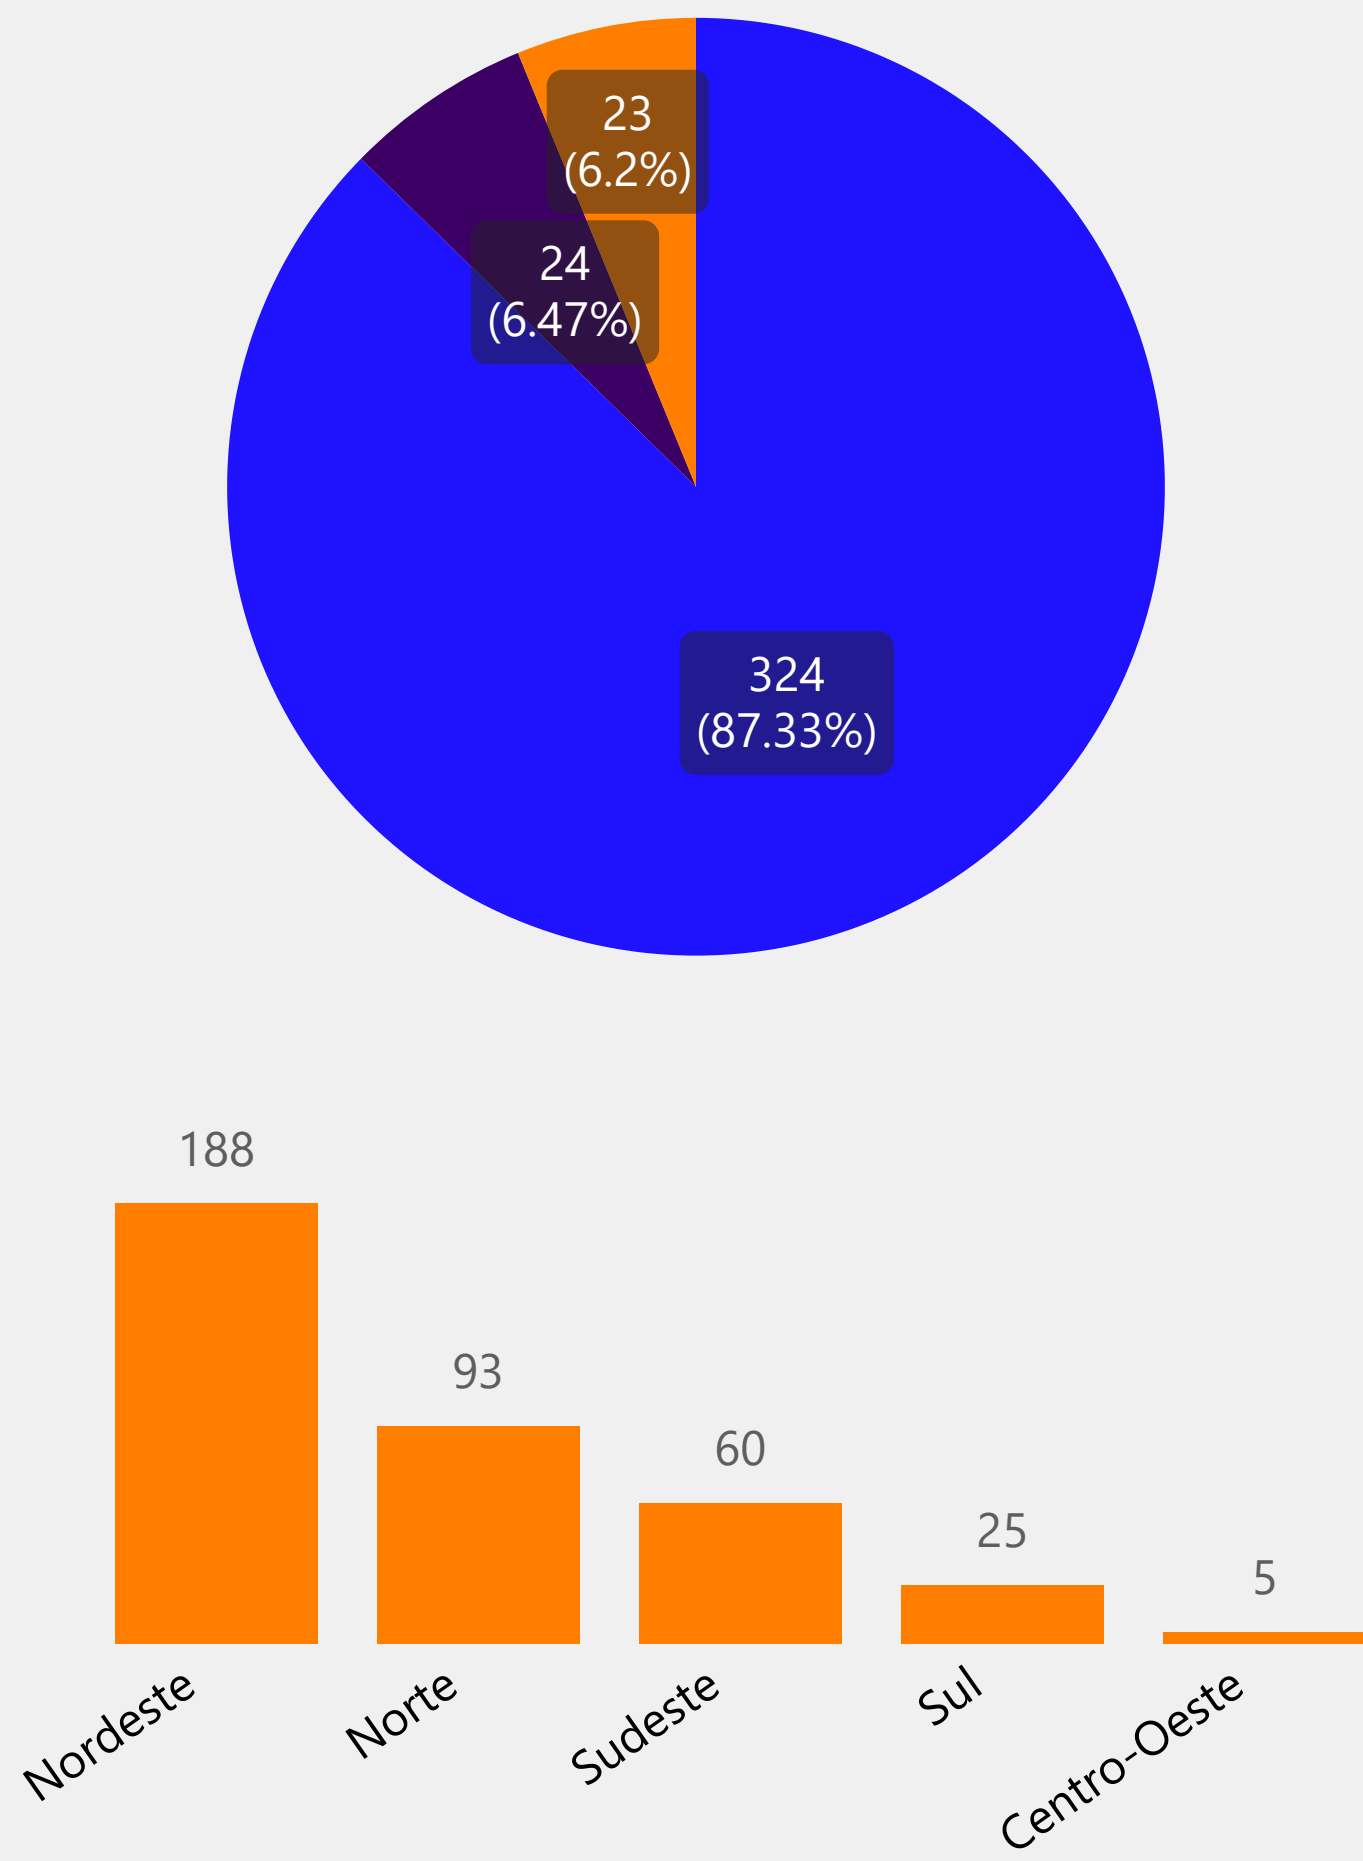

Escolas Previstas	Escolas Atualmente Conectadas
8,000	371

(*) 1.144 escolas foram desconectadas ao longo do projeto.

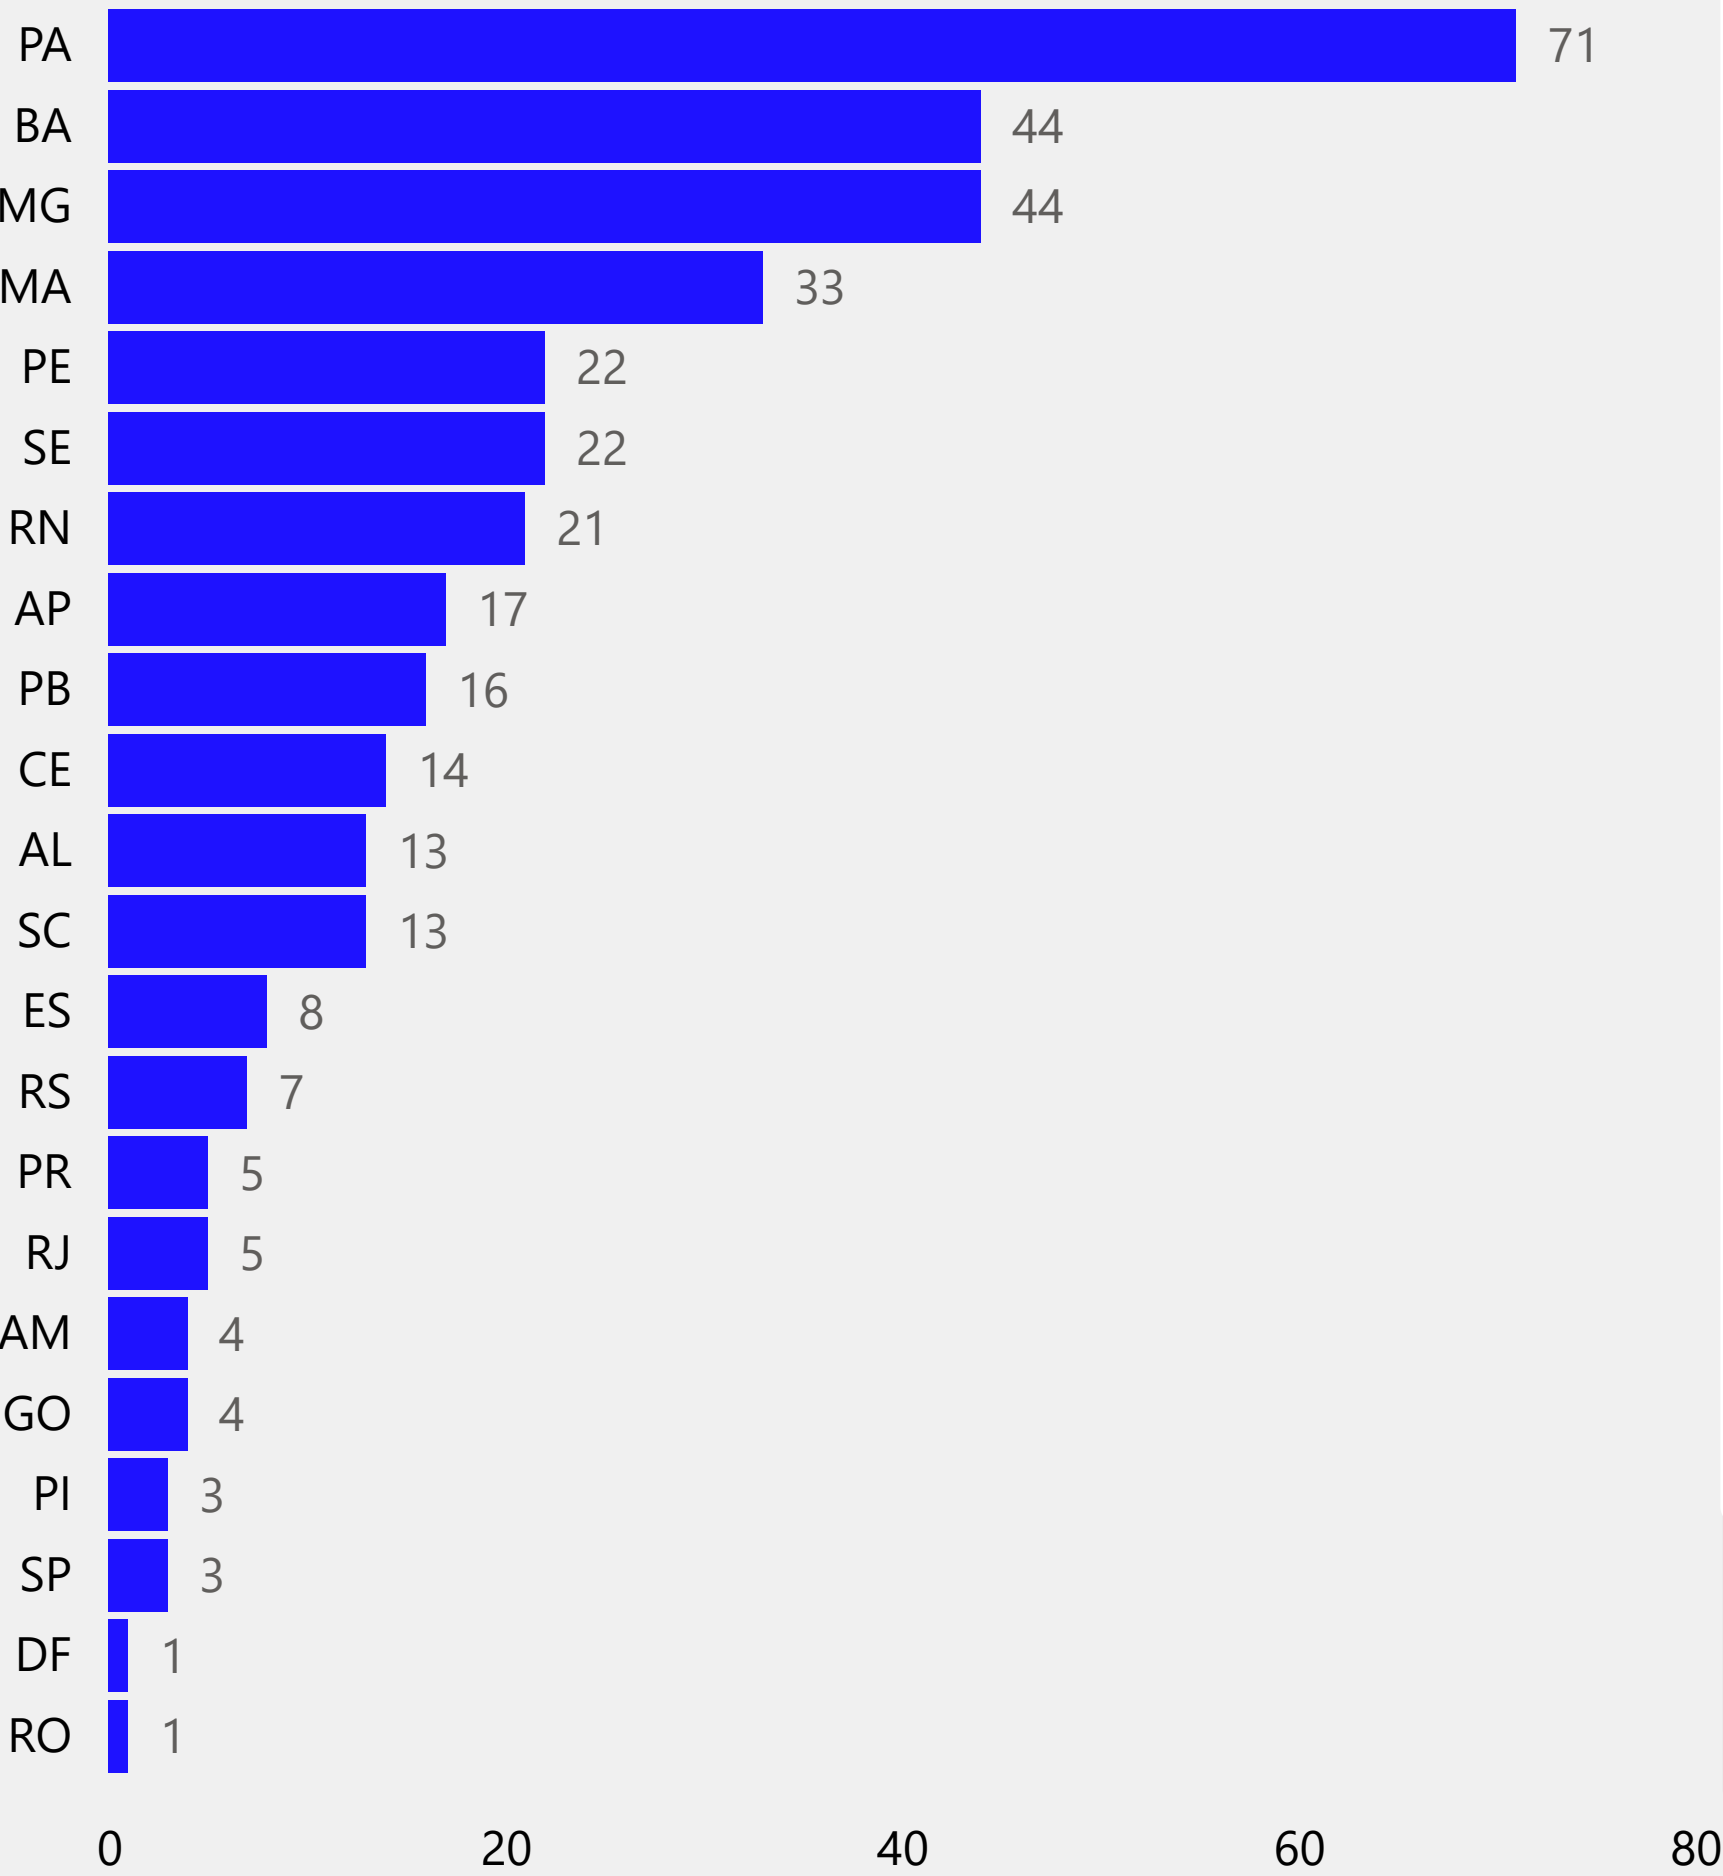

Documentação de contratação

ADC 10802-2022 Lista das escolas participantes da primeira chamada
ADC 10802-2022 Resultado do processo de contratação – 1º lote
ADC 10802-2022 Resultado do processo de contratação – 2º lote
ADC 10802-2022 Resultado do processo de contratação – 3º lote
ADC 10802-2022 Resultado do processo de contratação – 4º lote
ADC 10802-2022 Termo de referência Primeira Chamada
ADC 11452-2022 Lista das escolas participantes da segunda chamada
ADC 11452-2022 Resultado do processo de contratação – 1º lote
ADC 11452-2022 Resultado do processo de contratação – 2º lote
ADC 11452-2022 Resultado do processo de contratação – 3º lote
ADC 11452-2022 Resultado do processo de contratação – 4º lote
ADC 11452-2022 Resultado do processo de contratação – 5º lote
ADC 11452-2022 Resultado do processo de contratação – 6º lote
ADC 11452-2022 Termo de referência Segunda Chamada

Próximos passos

Renovação de todos os contratos ativos para manutenção das conexões até dezembro/2025.

Relato de progresso financeiro

⊕ Recurso Disponibilizado no 3º Termo Aditivo	R\$ 46,421,376.00	
⊕ Custeio do Contrato de Gestão (PRORNP)	R\$ 5,106,351.36	11.00%
⊕ Orçamento do projetos Conexão das Escolas	R\$ 41,315,024.64	
⊕ Despesas operacionais administrativas do projeto	R\$ 5,937,640.84	14.37%
⊖ Despesas financeiras com as metas		
Acompanhamento técnico das conexões	R\$ 3,210,107.40	7.77%
Efetivação das conexões às escolas	R\$ 26,427,511.53	63.97%
Construção e manutenção da plataforma para gestão das contratações	R\$ 4,849,743.41	11.74%
⊕ Despesas estimadas com a continuidade das metas do projeto	R\$ 890,021.46	2.15%



Saiba mais sobre o 3º Termo Aditivo

Saiba mais sobre o Relatório de Gestão 2022

Saiba mais na área de acesso a informação RNP
